

## 表單設計說明

- 表單共分四個單位，依序排列如下：
  1. 設施總表（抽查項目數量檢查表）
  2. 抽查紀錄表（抽查項目數量檢查表）
  3. 檢查紀錄（不符及其他建議事項）
  4. 抽查照片

## 表單設計說明

### 設施總表 ( 抽查項目數量檢查表 )

- 該數量檢核表係為整個水土保持設施數量統計，以利後續進行水土保持設施完工後抽查資料匯整，本頁係為最後檢查結果總結，非針對單一設施檢查紀錄區

**水土保持計畫完工檢查紀錄**

檢查日期： 年 月 日      檢查批次：

水土保持計畫名稱			
水土保持義務人			
實施地點 土地標示	縣(市) ( 事業區	鄉(鎮、市、區) 林班	段 小段 地號 小班)
水土保持計畫 核准日期文號			
水保施工許可證 核發日期文號			
開工日期	年 月 日	申報完工日期	年 月 日

**抽查項目數量檢核表**  
(設施抽查量最少應滿足各類設施不同型式項目總和之三分之一)

項目	核定項目數量	抽驗項目數量	檢查結果 (未完成者詳功能抽驗表)
1. 排水設施			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣 <input type="checkbox"/> 無此項
2. 滯洪設施			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣 <input type="checkbox"/> 無此項
3. 沉砂設施			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣 <input type="checkbox"/> 無此項
4. 坡面蔽水及排水處理設施			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣 <input type="checkbox"/> 無此項
5. 邊坡穩定設施			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣 <input type="checkbox"/> 無此項
6. 植生			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣 <input type="checkbox"/> 無此項
7. 擋土構造物			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣 <input type="checkbox"/> 無此項
8. 監測系統			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣 <input type="checkbox"/> 無此項
9. 其他			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣 <input type="checkbox"/> 無此項

**檢查結果**

已達完工標準      部分尚待改善      未達完工標準(未依計畫施作)

## 表單設計說明

### 抽查紀錄表 ( 功能抽驗表 )

- 該抽驗表配合上頁數量檢核表填寫

**功能抽驗表(設施抽查量最少應滿足各類設施不同型式項目總和之三分之一)**

抽驗設施編號	抽驗位置	核定內容	檢查內容	差異百分比	檢查結果
植生			<input type="checkbox"/> 覆蓋率達90%以上 <input type="checkbox"/> 覆蓋率未達90%以上		<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣 <input type="checkbox"/> 無此項
滯洪池	翻污柵				<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣
	出水口	寬： 高：			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣
	溢洪口	寬： 高：			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣
機械抽排馬達	池體	馬力：			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣 <input type="checkbox"/> 無此項
		長： 寬： 深：			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣
		聯外排水	長度： 寬： 深：		
擋土構造物	起點(漸變最小處)	長度： 有效高： 頂寬：			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣
	中點	有效高： 頂寬：			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣
	終點(漸變最大處)	有效高： 頂寬：			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣
集水井		長： 寬： 深：			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣
排水溝U	距排水方向起點 m	長度：			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣
		寬： 深：			<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣
					<input type="checkbox"/> 已完竣 <input type="checkbox"/> 未完竣

## 表單設計說明

### 檢查紀錄 ( 不符及其他建議事項 )

- 針對檢查缺失記錄並提供相關建議事項，並要求相關人士簽名以確定相關資訊已完成通知。

檢 查 記 錄	
實地與計畫或規定不符事項(填寫請說明施作項目及不符事項，如排水溝U1施作位置錯誤)：	
其他注意事項(填寫請說明施作項目，如排水溝U1有雜物堵塞)：	
<p>四、相關單位及人員簽名</p> <p>(一) 檢查單位及人員：</p> <p>(二) 會同檢查單位及人員：</p> <p>(三) 承辦監造技師：</p> <p>(四) 水土保持義務人：</p> <p>(代理人應檢附委託書)</p> <p>說明：本項檢查係配合承辦監造技師簽證之水土保持計畫竣工檢核表進行抽驗，有關涉及工程品質及未抽驗之部分應由水土保持義務人及承辦監造技師負責。</p>	

## 表單設計說明

### 抽查照片

- 針對功能抽驗表各檢查設施拍照取證

檢 查 照 片 (各抽驗項目最少應含1張照片)	
說明：永久性防沖措施 - 排水設施	說明：永久性防沖措施 - 漂洪、沉砂
說明：永久性防沖措施 - 聯外排水	說明：永久性防沖措施 - 邊坡穩定措施
說明：永久性防沖措施 - 坡面保護設施	說明：永久性防沖措施 -

## 表單填寫說明

- 表單非固定式，其相關內容應配合檢查之水土保持計畫調整內容
- 公會應辦理事項：
  1. 應先完成水土保持計畫個案之抽查項目數量檢查表（核定數量及抽驗數量），再交由執行檢查技師。
  2. 配合前項數量檢核表完成個案之功能抽驗表，無該設施應刪除，另應保留最少抽驗數量欄位供檢查技師填寫。
  3. 公會取得檢查紀錄後，應先確認檢查紀錄是否有缺漏（常見缺漏見下頁），確定無誤後再函文縣府。

## 表單填寫說明

### 檢查人員應辦理事項：

1. 依公會提供之水土保持計畫個案抽查項目數量檢查表（核定數量及抽驗數量），決定該案抽查設施，設施抽查量最少應滿足各類設施不同型式項目總和之三分之一。
2. 抽查設施如屬擋土設施者，應抽檢該設施3處
  - 起點or漸變最小處
  - 中間抽驗點（應紀錄其抽驗位置屬起點起算距離）
  - 終點or漸變最大處

## 表單填寫說明

檢查人員應辦理事項：

3. 抽查設施如屬排截水設施者，應抽檢1處通水面積，並記錄該抽檢處距排水方向起點位置。
4. 機械抽排馬達應拍攝出廠證明文件（型號）或馬達輸出功率（銘牌）。
5. 抽查照片應對映抽查設施，如有9處抽查設施，則最少應有9組對映照片（含全景及相關丈量資訊，全景圖有多重設施者應於圖面加註設施資訊）。
6. 截排水設施之照片如其背景無可參照物者（如平坦地），應於照片上加註排水方向。

## 規則

- 直觀


表單有什麼看什麼記錄什麼

- 對照

紀錄 vs 照片

- 數量

照片數量最少六張(水保局規定)

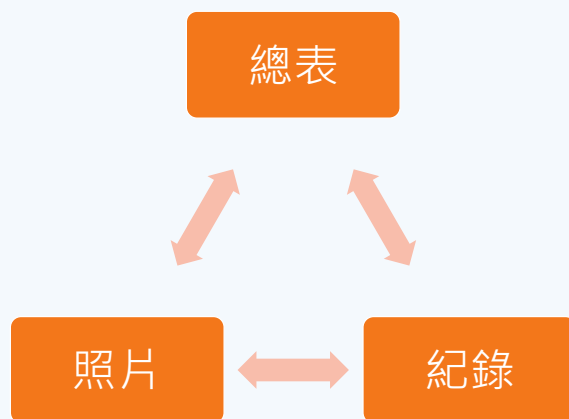

## 結論

- 表單之制式化，其原因有二
  1. 水土保持局針對水土保持設施完工後抽查資料，希借由完工檢查時可完成其完工之水土保持設施總量進行紀錄。
  2. 本縣水土保持計畫在完工後，已有因土地開發商與購地者交易衝突造成購地者提出未依計畫施作等告訴情事，在法院或檢調在調卷時，皆反映現地無法與完工紀錄做為比對（未記錄抽查位置）。
- 據此，請承辦之公會及檢查人員配合完善檢查紀錄，如針對該表格內容有任何指教，本府皆可配合調整。



攜手大步走

水保向前行
